



LEGENDA							
S0.01	Scavo fondazioni	ST2.02	Posa in opera pannelli in lamiera grecata (vano scale)	CO2.01	Posa in opera controsoffitto	PV1.01	Posa in opera pannelli di paglia compressa
F0.01	Sottofondazione in magrone sp 10 cm	ST3.01	Assemblaggio struttura IPE 200 e HEB 160 (vano ascensore)	CO2.02	Posa in opera lana di kenaf	PV1.02	Posa in opera pannelli in cartone riciclato
F0.02	Casseratura	ST3.02	Posa in opera pannelli di lamiera grecata (vano ascensore)	CO3.01	Posa in opera pavimento in laminato	I0.01	Posa in opera UTA
F0.03	Posa in opera armatura	ST4.01	Assemblaggio struttura IPE 200 e HEB 160 (locale impianti)	CO4.01	Posa in opera copertura in lamiera	I1.01	Posa in opera condotti di areazione
F0.04	Getto fondazione	ST4.02	Posa in opera pannelli di lamiera grecata (locale impianti)	CO5.01	Posa in opera pavimentazione in conglomerato bituminoso	I2.01	Posa in opera ascensori
F0.05	Maturazione calcestruzzo	ST5.01	Posa in opera travetti e polistirene	CV0.01	Posa in opera sottostruttura in profilati "C" e "U"	SA0.01	Posa in opera sanitari
F0.05	Maturazione calcestruzzo	ST5.02	Posa in opera travetti in legno per vano impiantistico	CV0.02	Posa in opera pannelli di finitura lana mineralizzata (fase 1)	PT0.01	Posa in opera porte
ST0.01	Assemblaggio posa in opera arco in CLS	ST5.03	Posa in opera doppio strato di OSB	CV0.03	Posa in opera pannelli isolanti in lana di kenaf		→ Attività
ST1.01	Assemblaggio a terra HEA 280 e IPE 500	ST6.01	Posa in opera IPE 300 IPE 160 HEB 160 (struttura copertura piana esterna)	CV0.04	Posa in opera barriera al vapore	- - →	Attività fittizia
ST1.02	Assemblaggio a terra travi IPE 220 tra due archi	ST7.01	Posa in opera struttura portante facciata cinetica	CV0.05	Posa in opera pannelli di finitura lana mineralizzata (fase 2)	○	Inizio/fine attività
ST1.03	Aggancio blocco agli archi	CO0.01	Posa in opera pannelli sandwich	CV1.01	Posa in opera facciata cinetica		
ST1.04	Assemblaggio in aria IPE 220	CO0.02	Posa in opera pannelli in policarbonato	PV0.01	Posa in opera facciata cinetica		
ST2.01	Assemblaggio scale in acciaio zincato	CO1.01	Posa in opera tende mobili	PV0.02	Posa in opera pannelli in cartone		

DIAGRAMMA DI PERT PER I QUATTRO CANTIERI CONTEMPORANEI DEL CARDO (SUD A, SUD B, NORD A, NORD B1, NORD B2)

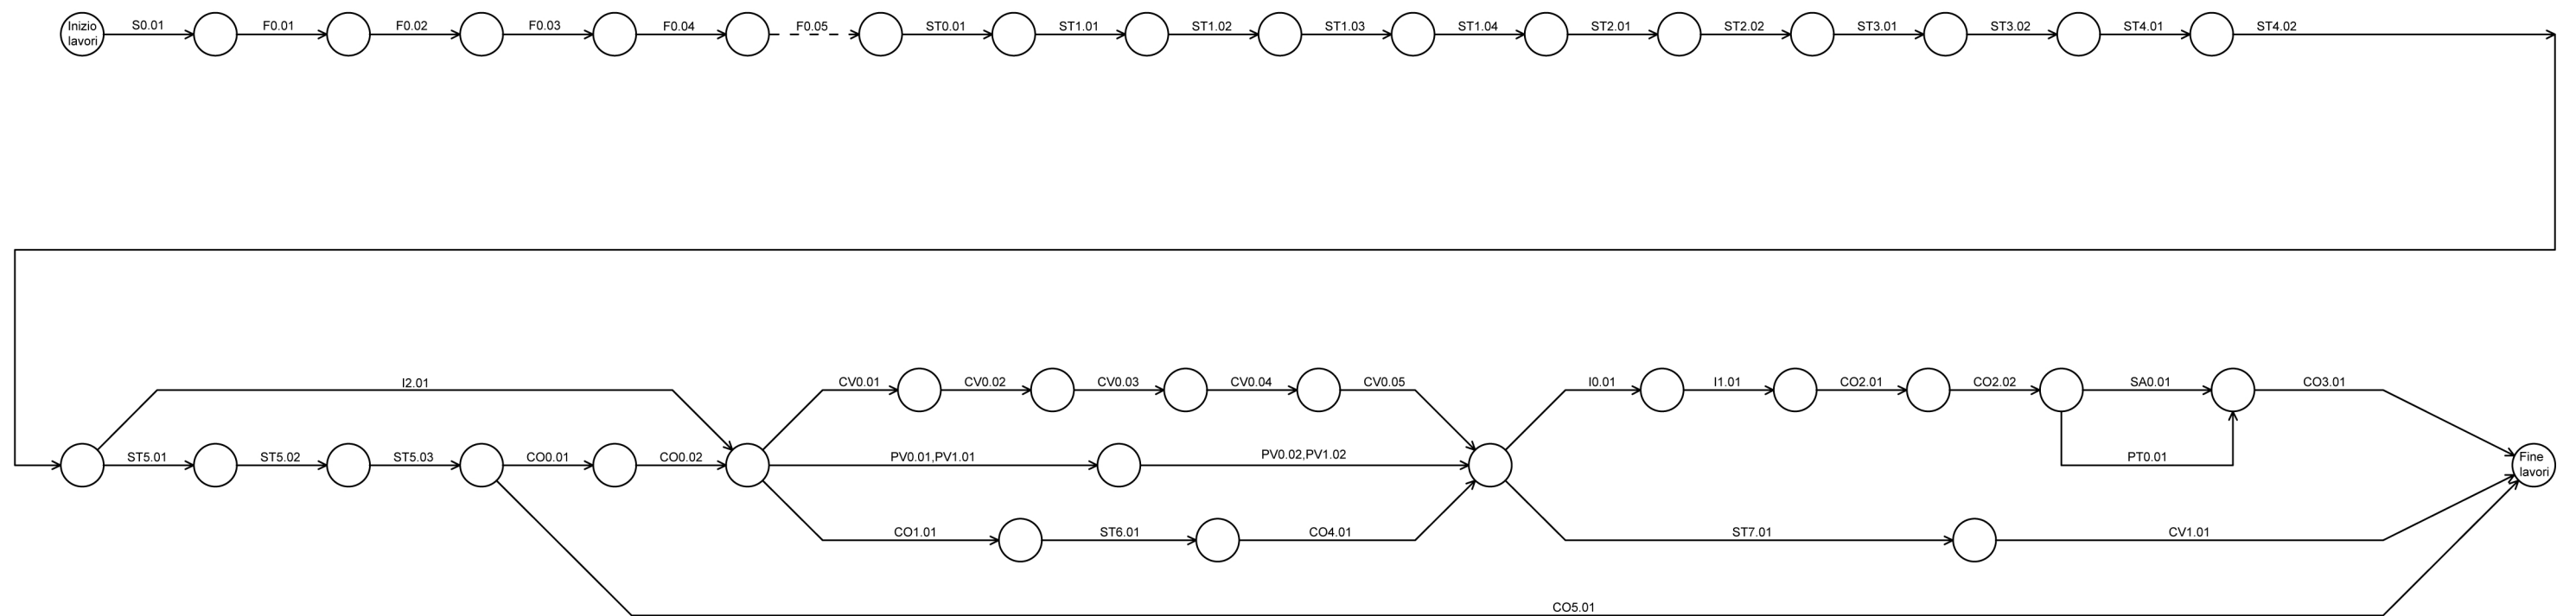

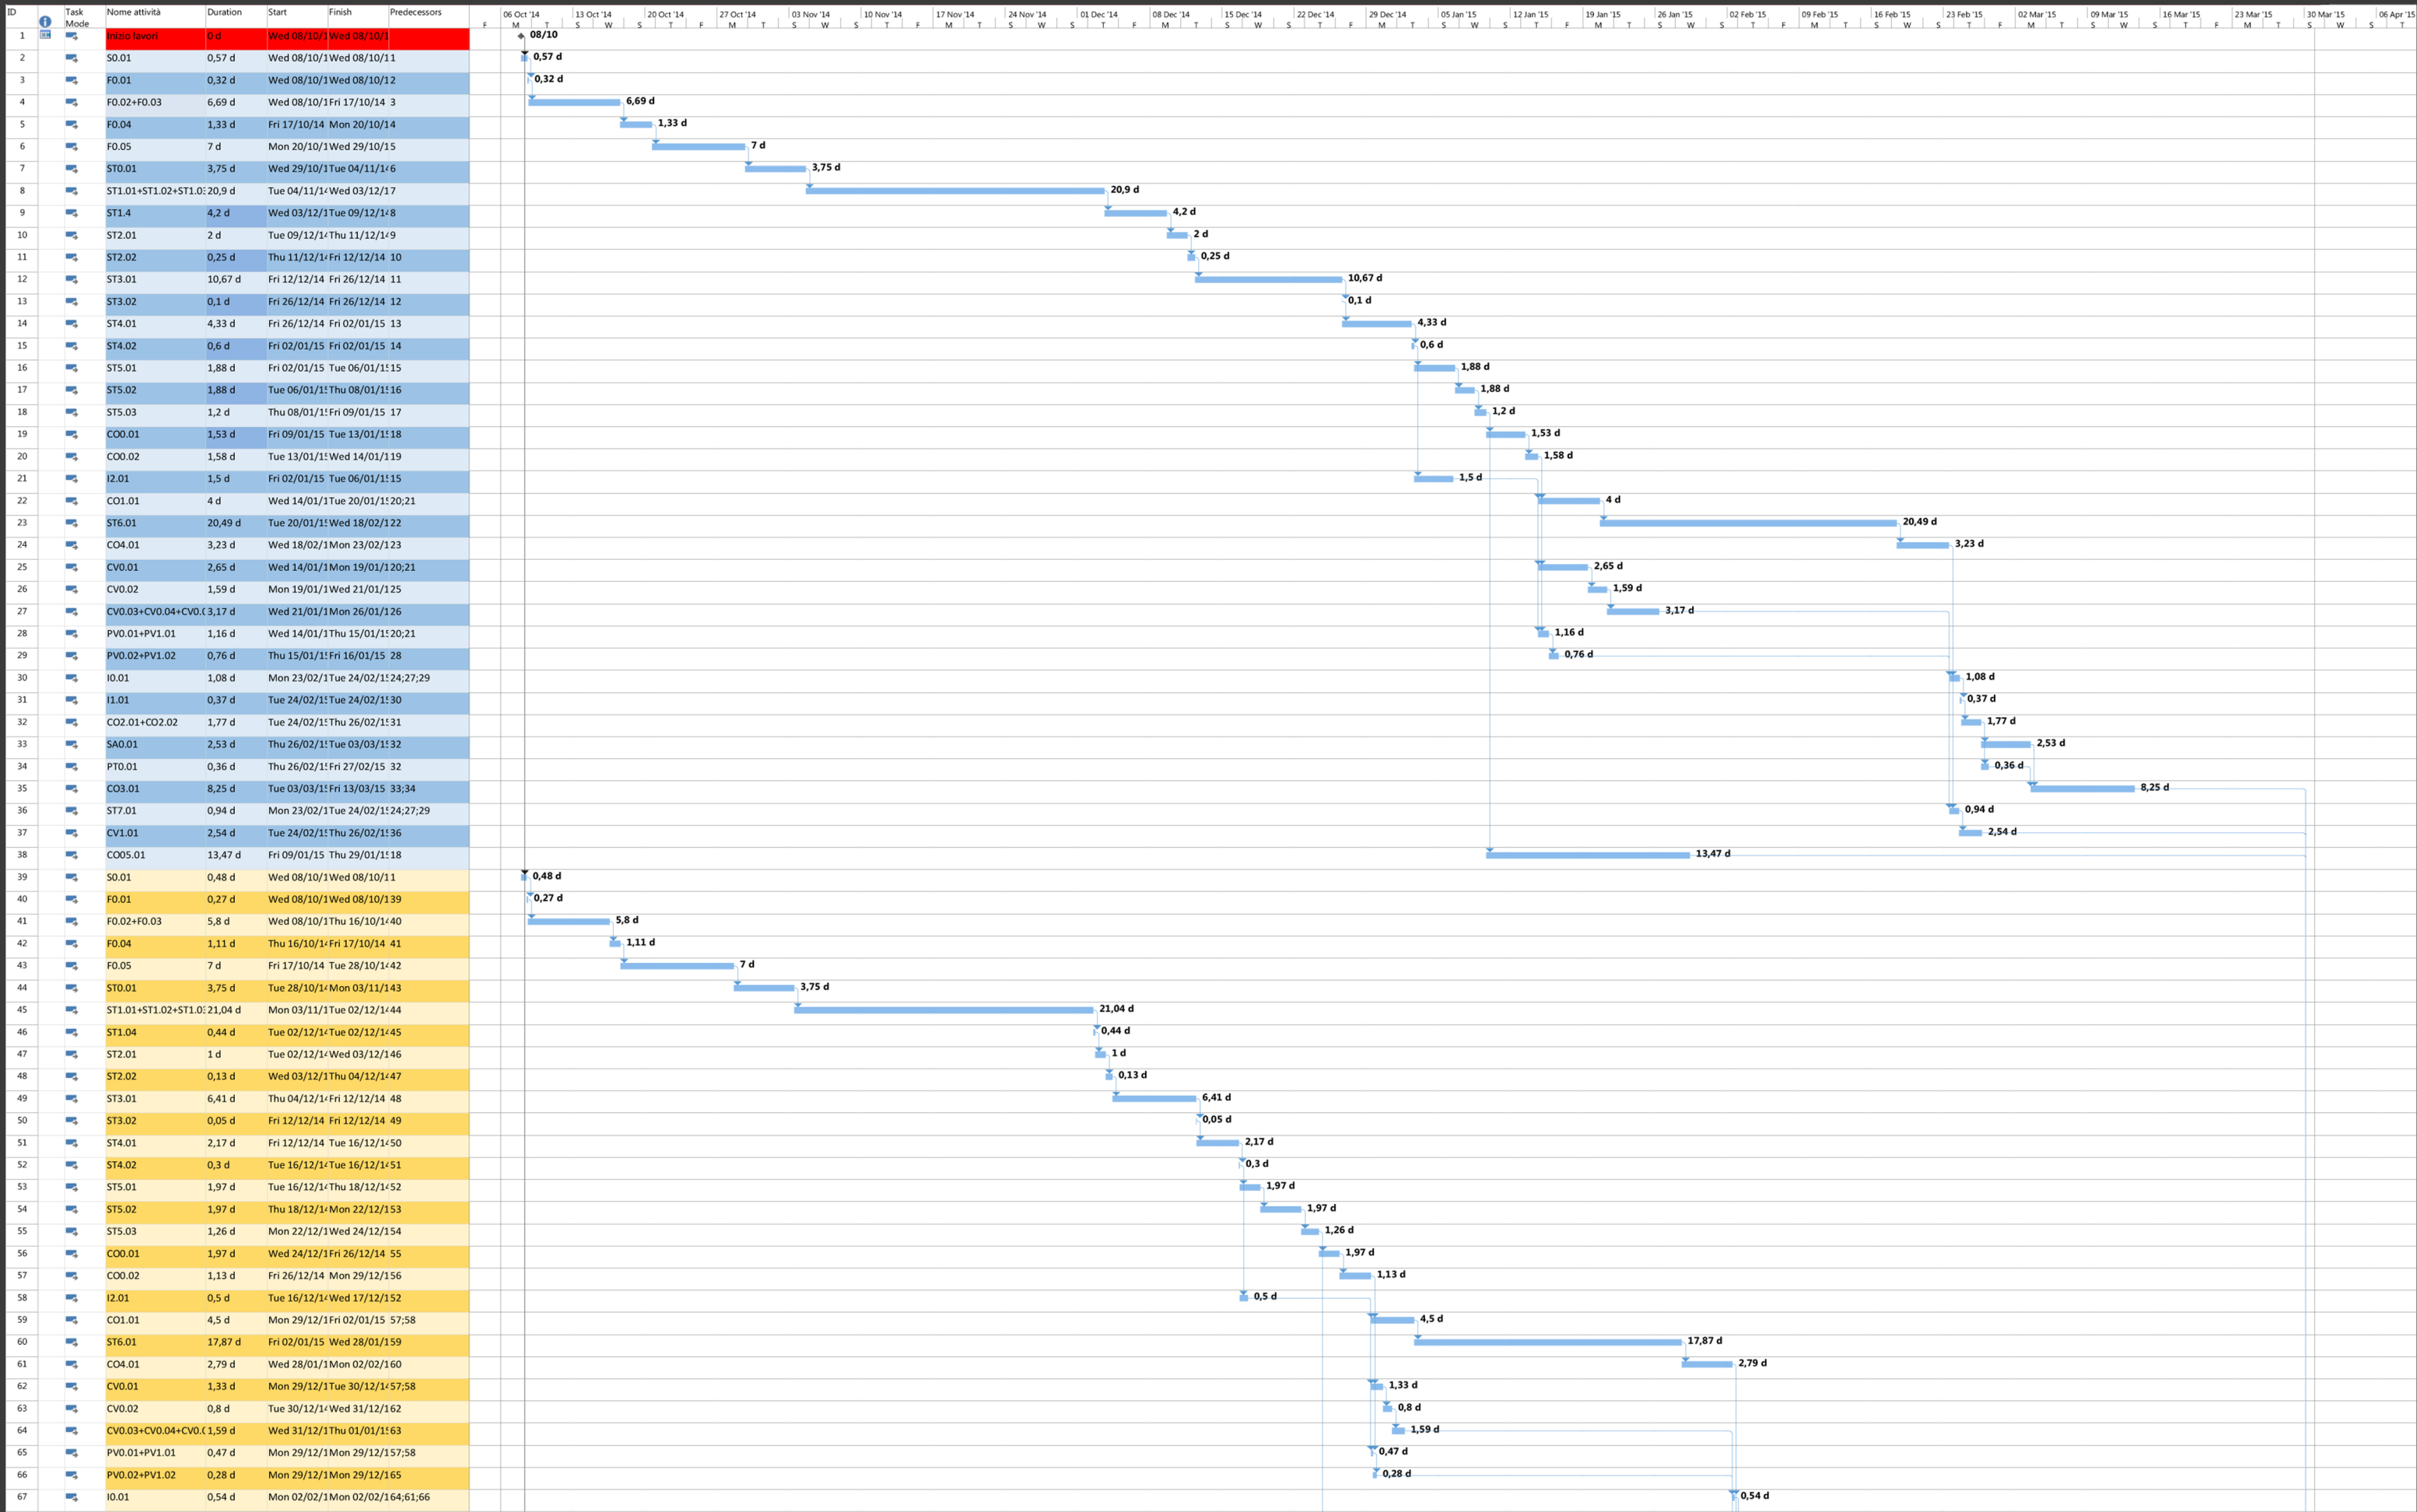


Progetto: Padiglione Italia
Data: Wed 01/07/15

LEGENDA

- Attività
- Attività critica
- Inizio/fine lavori
- SUDA
- SUD B
- NORD A
- NORD B1
- NORD B1

DIAGRAMMA DI GANTT

PROGETTO ERGOTECNICO

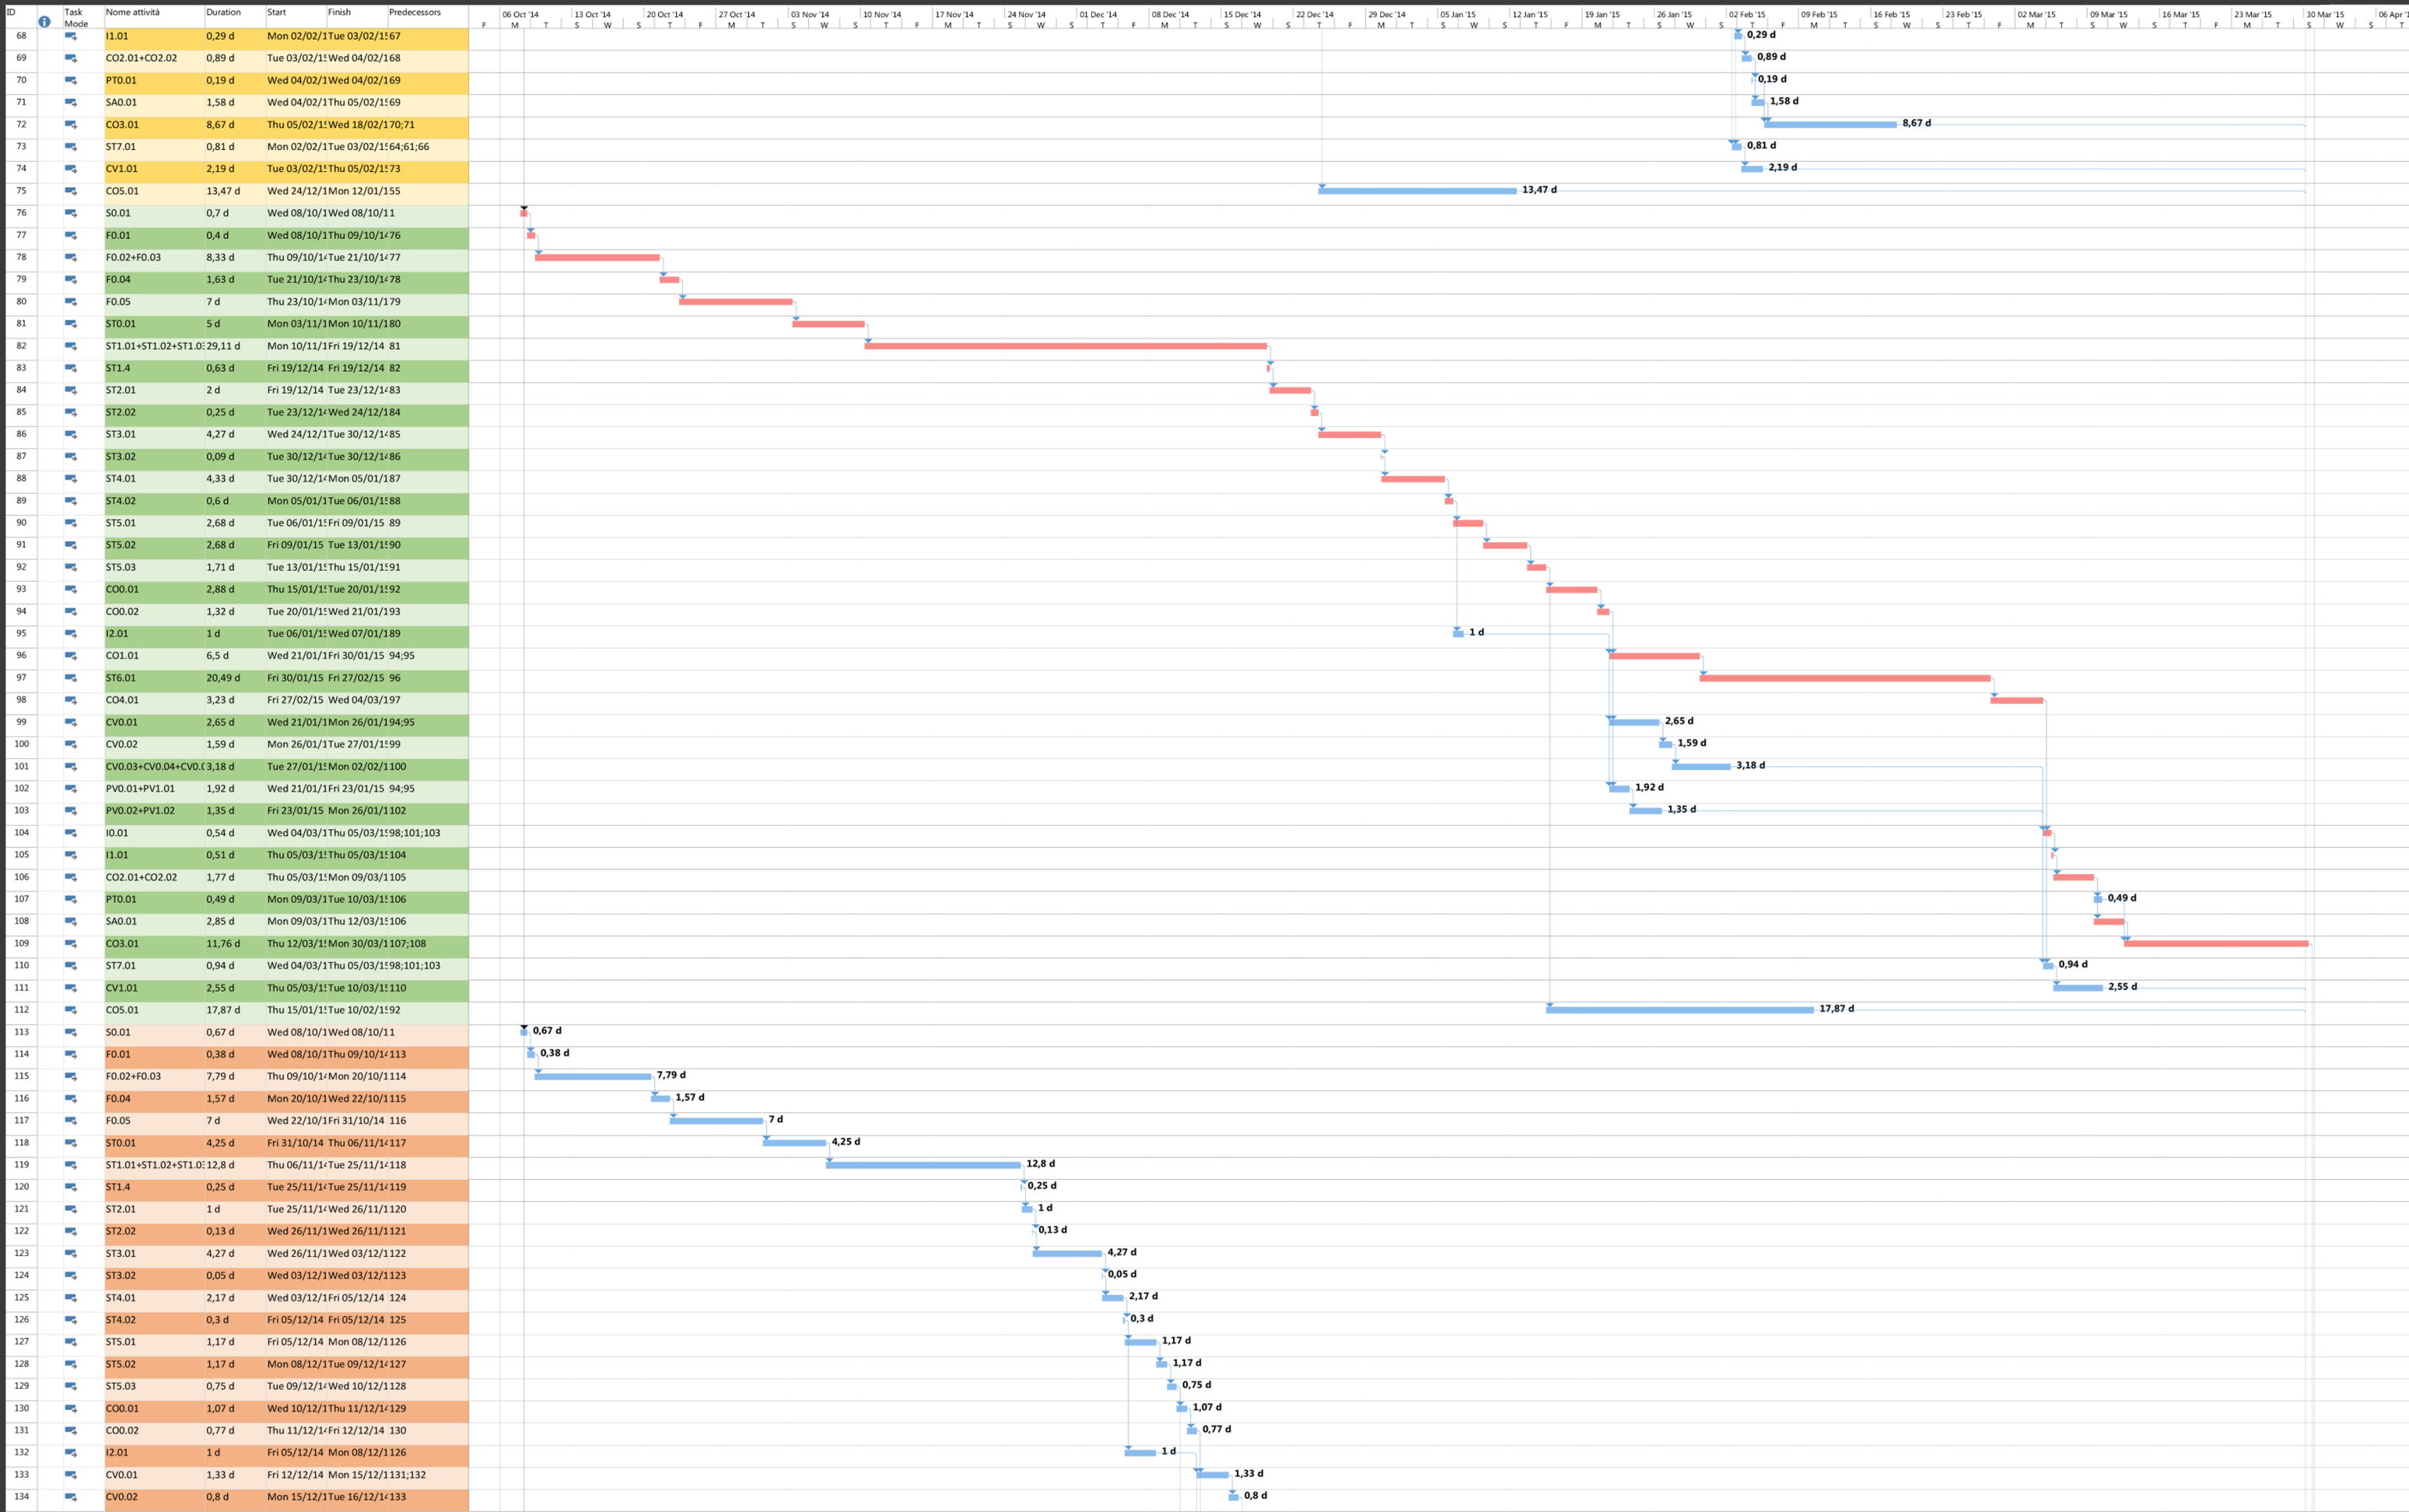


Progetto: Padiglione Italia
Data: Wed 01/07/15

LEGENDA

- Attività █
- Attività critica █
- Inizio/fine lavori ▬
- SUDA
- SUD B
- NORD A
- NORD B1
- NORD B1

DIAGRAMMA DI GANTT

PROGETTO ERGOTECNICO

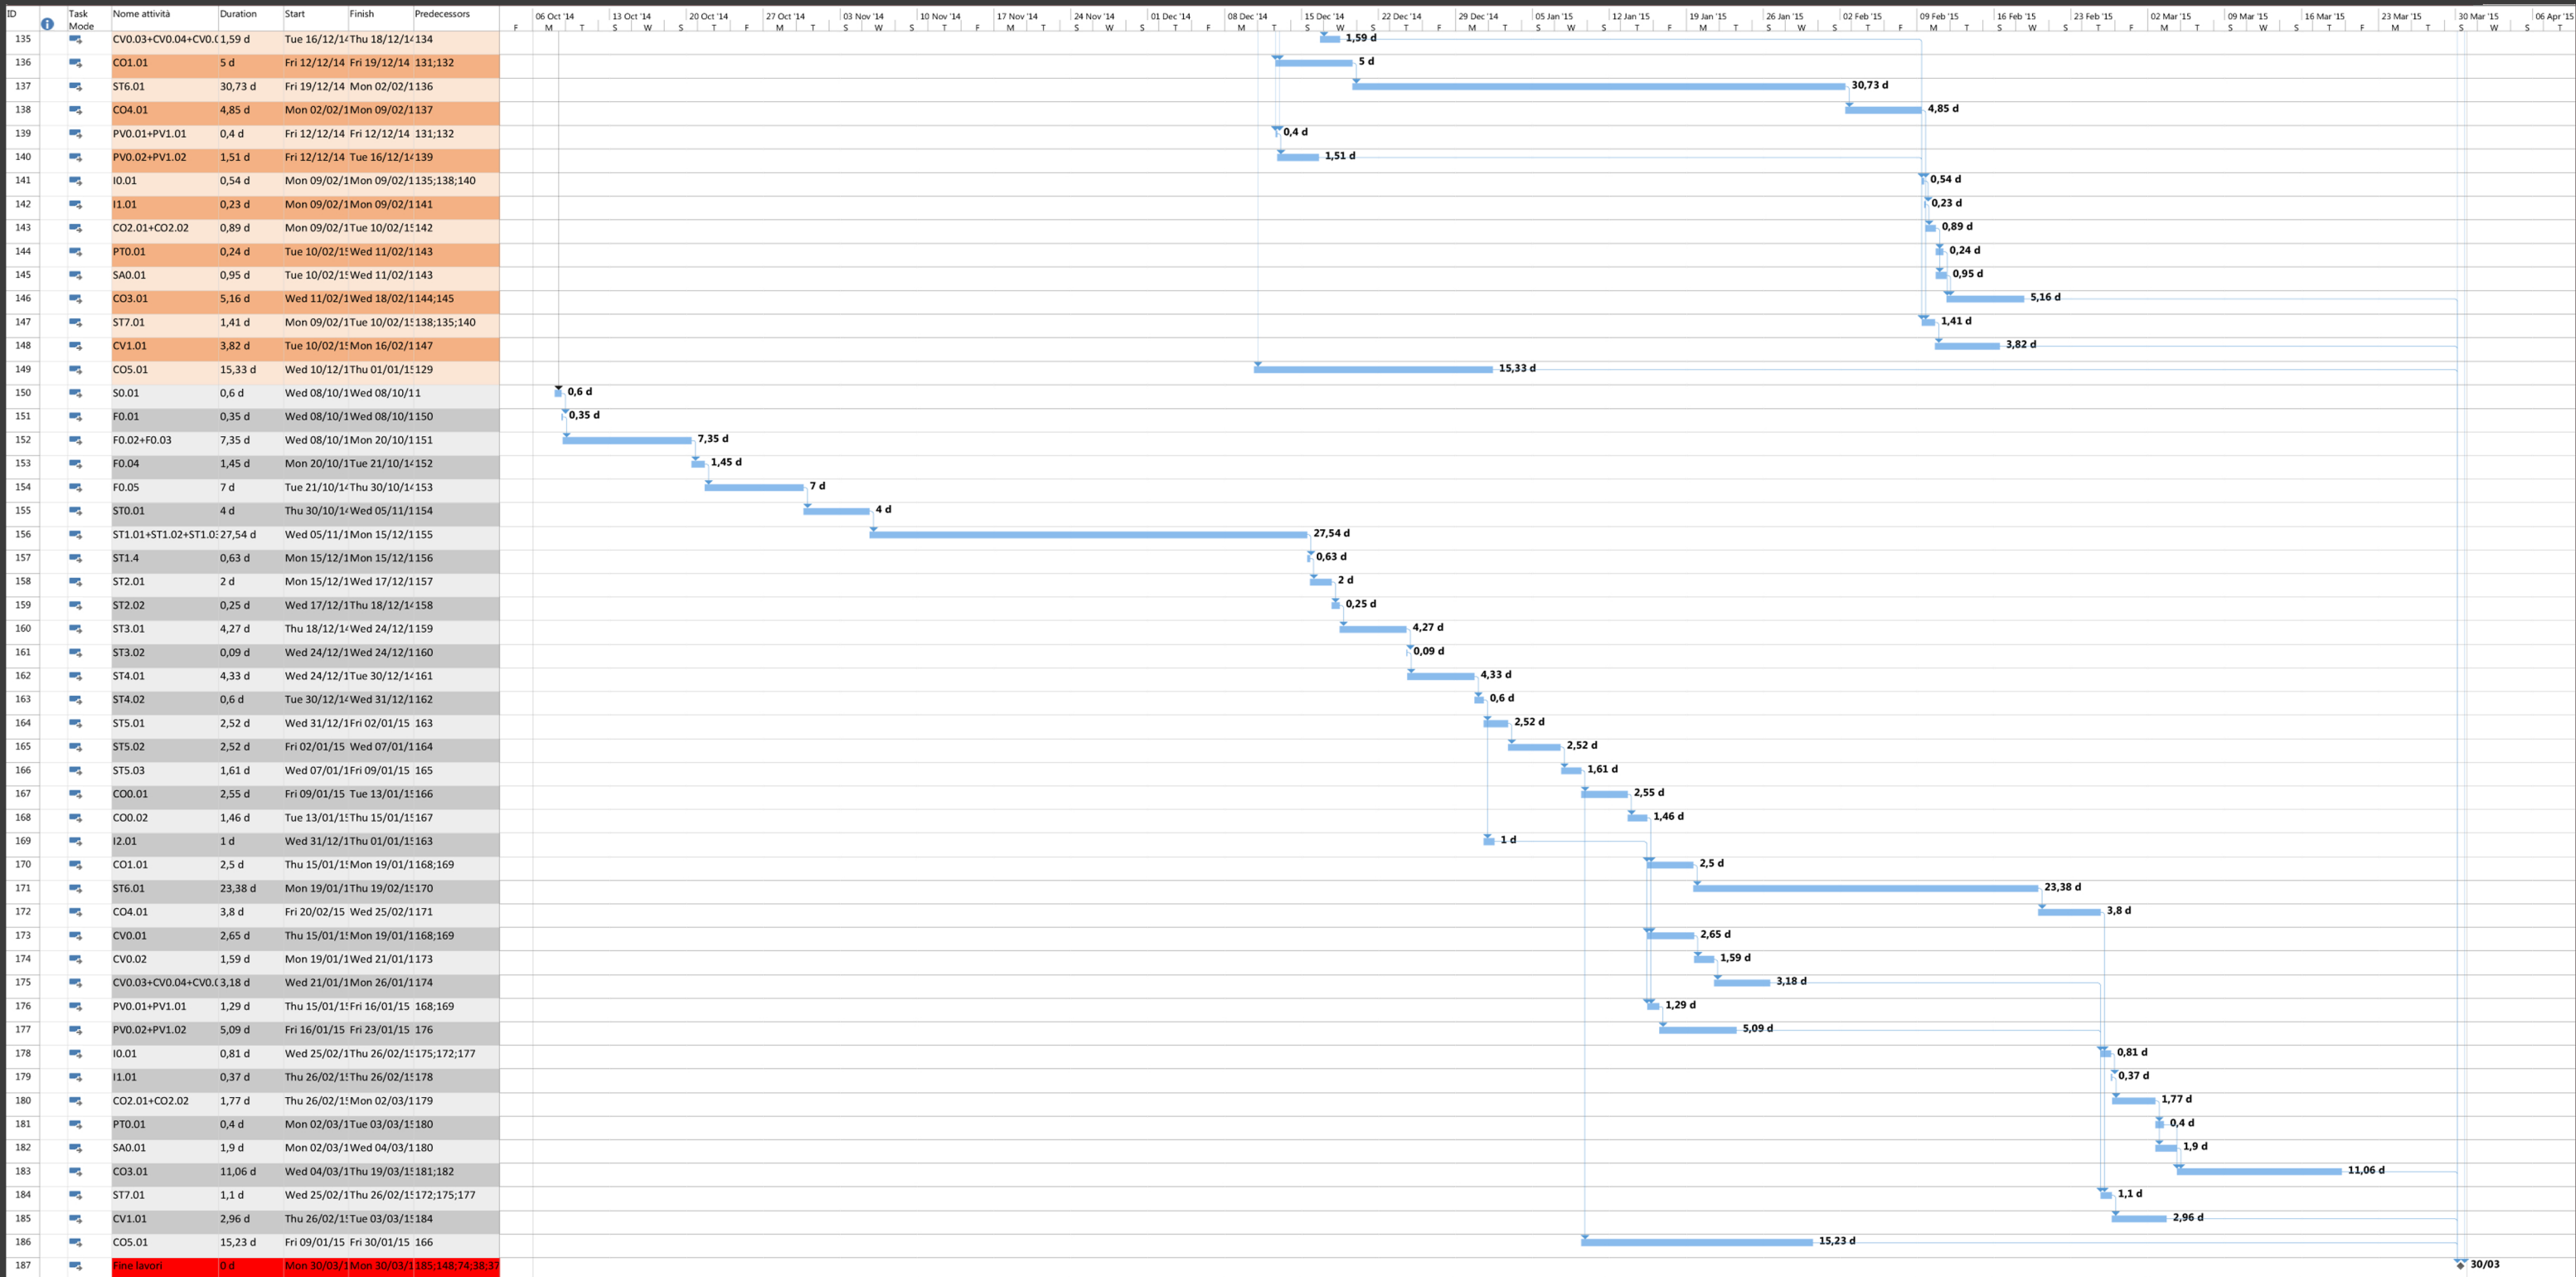

LEGENDA

Attività █
 Attività critica █
 Inizio/fine lavori ◆

SUDA SUD B NORD A NORD B1 NORD B1
